

**CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos**  
**Dirección de Planificación**

**PROYECTO: K003 CGREG: Ejecución de un Sistema Integrado de Encuestas para el Régimen Especial de Galápagos**

Líder del Proyecto:	Granda León, Marianita de Lourdes (mgranda@gobiernogalapagos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramos Chalen, Angel Misael	Programas Relacionados:	EJECUCION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS PARA EL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
Titular:	Noroña Torres, María Catalina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	76,700.00
CUP:	90450000.0000.374487	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	1,918.28
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	81,087.18
Localidad de Gestión:	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/01/2014 - 15/12/2015
Fecha de última actualización:	05/08/2015	Fecha de Fin Base:	15/12/2015
Modificado por:	Granda León, Marianita de Lourdes	Fecha del siguiente Hito:	01/09/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

Ejecución de un Sistema Integrado de Encuestas para el Régimen Especial de Galápagos que permitirá la generación de información estadística sobre los sectores productivos y sobre la estructura y costo de la Canasta Analítica de la provincia.

**PRODUCTO O SERVICIO:**

A partir de este proyecto se generarán productos que son publicaciones en forma digital o impresa con información estadística socioeconómica de Galápagos.

**LINEA BASE:**

Actualmente se cuenta con información oficial social y económica de Galápagos procesada a partir de los Censos de Población y Vivienda, Censo Económico, Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales.

**OBJETIVO GENERAL:**

Establecer un sistema de información socio económica de los hogares de Galápagos que integre la estructura de las Canastas Analíticas: básica y vital de Galápagos al igual que precio de adquirirla por cada mes de 2015.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Determinar la estructura de las Canastas Analíticas de Galápagos a partir de los datos de la encuesta de ingresos y gastos ENIGHUR 2011.
- Realizar el levantamiento de información para el cálculo del costo mensual de la canasta durante el año 2015.
- Realizar una encuesta al sector agropecuario para determinar la oferta agropecuaria en variedad y cantidad.
- Alimentar el Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos con información socio económica de los hogares respecto a la adquisición de las Canastas Analíticas.

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir a consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible.

**Tipo de Beneficiario**

La población afectada de este proyecto se compone por el primer grupo que son los 7.236 hogares de Galápagos conformados por 13.021 hombres y 12.103 mujeres. Y un segundo grupo conformado por la Población Económicamente Activa (PEA) que son 12.484 personas de las cuales 7.510 son hombres frente a 4.974 mujeres.

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 23 meses

COSTO: El presupuesto límite será \$234.433,20

**Restricciones**

ALCANCE: Provincia de Galápagos

RECURSOS: Proyecto financiado con recursos estatales.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 81.29 %

Fecha de Inicio: 15/01/2014

Fecha de Fin: 15/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

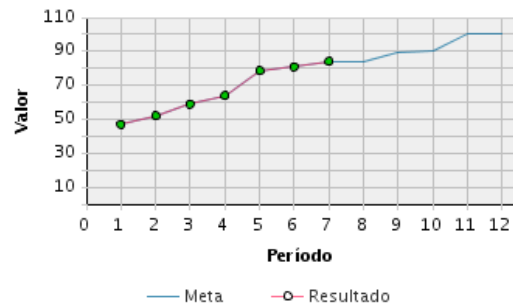

**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	47 %	52 %	59 %	64 %	78 %	81 %	84 %	84 %	89 %	90 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	47 %	52 %	59 %	64 %	78 %	81 %	84 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2015</b> Se realizó la publicación de la página web de indicadores. Se realizó la digitación de los registros administrativos de la gestión de vehículos que realiza el CGREG. El período de registros administrativos digitados es de 1998 a 2008.</p>	Granda León, Marianita de Lourdes	05/08/2015 - 07:48 PM
<p><b>JULIO 2015</b> - Evento de difusión de resultados del Censo de UPA realizado. Se contó con la presencia del Ministro Presidente del CGREG, del Alcalde de Santa Cruz, del Director Provincial del MAGAP, del Director Ejecutivo del INEC (e). - Se ha organizado el contenido y la agenda para dictar capacitación sobre el uso de las bases de datos del Censo de UPA. Este curso está dirigido a técnicos del CGREG, MAGAP, ABG, GAD, Observatorio de Turismo/MINTUR. Se espera una asistencia de 28 técnicos.</p>	Granda León, Marianita de Lourdes	08/07/2015 - 11:32 AM
<p><b>MAYO 2015</b> - Taller de trabajo con director y técnicos del MAGAP para analizar la selección de indicadores a ser publicados en la publicación Censo de UPA de Galápagos 2014. - Construcción de mapas temáticos de uso de suelo en las UPA. - Edición final de la revista de resultados y análisis del Censo de UPA de Galápagos 2014. - Agendado el evento de lanzamiento de las bases de datos del Censo de UPA de Galápagos 2014.</p>	Granda León, Marianita de Lourdes	02/06/2015 - 10:30 AM
<p><b>ABRIL 2015:</b> - Revista de resultados del Censo de UPAs de Galápagos: se realizó corrección de estilos, diseño gráfico, toma y selección de fotografías. - Realización del Tomo de Resultados Tabulados (120 páginas) del Censo de UPAs. - Prototipo del sitio web de indicadores.</p>	Granda León, Marianita de Lourdes	04/05/2015 - 06:51 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ENERO 2015:</b> - Revisión de la digitación de las 16 bases de datos del Censo Agropecuario. Inicio de la estructuración de las bases de datos en el software libre de procesamiento de datos PSPP.</p> <p><b>FEBRERO 2015:</b> - Finalización de 8 bases de datos de las 16 que resultarán del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos. - Construcción de boletín con principales resultados cuantitativos del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.</p> <p><b>MARZO 2015:</b> -Finalizado el proceso de estructuración de las 16 bases de datos resultantes del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos. -Boletín de principales resultados cuantitativos del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos revisados por la Dirección de Producción y por la Dirección de Comunicación.</p>	<p>Criollo Quimbiulco, Luis Fernando</p>	<p>04/05/2015 - 06:30 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2014:</b> 1. Se realizaron gestiones para establecer presupuesto del proyecto. 2. Se realizó investigación bibliográfica sobre Censos Agropecuarios en la región.</p> <p><b>MARZO 2014:</b> 1. Se inició coordinación con técnicos y directivos del INEC para trabajo interinstitucional. 2. Se realizó informe técnico sobre convenios de cooperación suscritos entre el INEC y el INGALA (ahora CGREG)</p> <p><b>ABRIL 2014:</b> 1. Se construyeron los términos de referencia para la contratación de un técnico en Estadística. 2. Se realizó informe técnico para dar de baja convenios desactualizados con el INEC.</p> <p><b>MAYO DE 2014:</b> 1. Se realizó informe técnico para suscribir convenio entre el CGREG y el INEC. 2. Se matuvo reunión con el INEC para acordar áreas de trabajo en conjunto.</p> <p><b>JUNIO DE 2014:</b> 1. Construcción del marco metodológico para el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos. 2. Se construyó el marco censal para el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos.</p> <p><b>JULIO DE 2014:</b> 1. Se realizó el instructivo para empadronadores del Censo. 2. Se diseñó el plan de capacitación para empadronadores del Censo.</p> <p><b>AGOSTO DE 2014:</b> 1. Se coordinó con el MAGAP trabajo en conjunto. 2. Se construyó la boleta censal, versión 1.</p> <p><b>SEPTIEMBRE DE 2014:</b> 1. Se realizó difusión de la boleta censal entre el INEC, MAGAP y ABG. 2. Se realizaron dos talleres de trabajo entre el CGREG, MAGAP e INEC para realizar la versión final de la boleta censal. 3. Trabajo de diseño gráfico de la boleta censal. 4. Se realizó gestión con el MAGAP para la participación de técnicos de esta institución en la validación de las boletas censales diligenciadas.</p> <p><b>OCTUBRE DE 2014:</b> 1. Se realizaron eventos de difusión y sociabilización entre los productores agropecuarios sobre el Censo de UPA. 2. Se realizó la capacitación y selección de empadronadores en cada uno de los cantones. 3. Se realizó gestión con el INEC para la participación de técnicos de esta institución en la supervisión del levantamiento de datos. 4. Se inició el levantamiento de datos en San Cristóbal e Isabela. 5. Se inició la digitación de datos en San Cristóbal.</p> <p><b>NOVIEMBRE DE 2014:</b> 1. Se inició el levantamiento de datos en Santa Cruz. 2. Se realizó validación y crítica de datos diligenciados.</p>	<p>Granda León, Marianita de Lourdes</p>	<p>31/12/2014 - 12:29 PM</p>

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se inició la digitación de datos de Santa Cruz e Isabela  DICIEMBRE DE 2014: 1. Se finalizó el levantamiento de datos en todos los cantones. 2. Se finalizó la validación y crítica de datos en todos los cantones. 3. Se finalizó la digitación de datos en todos los cantones.		
ENERO 2014: 1. Se procedió a realizar las correcciones sugeridas por la Subsecretaría de Planificación y Desarrollo. 2. Se obtuvo dictamen de prioridad por parte de SENPLADES.	Becerra Hernandez, Juan Carlos	05/02/2014 - 05:34 PM

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No se firma el convenio específico con el INEC para la ejecución del proyecto	04/05/2015	Marianita de Lourdes Granda León	60	60	36	0/0

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Alcance.</b> Si el INEC no define una Canasta Básica Nacional CAUSARÍA que no se pueda determinar una Canasta para Galápagos	05/05/2015	Marianita de Lourdes Granda León	20 %	50	10	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto aprobado y con dictamen de prioridad de parte de SENPLADES	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	4.0
2	PLANEACIÓN: Perfil y términos de referencia aprobados para contratación de técnico.	2-Publicación de Pliegos	27/05/2014		27/05/2014		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: Informe técnico para suscripción de convenio con INEC para cooperación interinstitucional de generación de información estadística.	5-Entregables Intermedios	10/06/2014		10/06/2014		Sí	4.0
4	PLANEACIÓN: Determinación del marco censal en trabajo conjunto con el INEC.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	PLANEACIÓN: Documento metodológico del Censo de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de Galápagos.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Construcción de la boleta censal. Censo de UPA de Galápagos	5-Entregables Intermedios	20/08/2014		20/08/2014		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Difusión de la propuesta de boleta censal a MAGAP, INEC, Agencia de Bioseguridad de Galápagos para revisión y sugerencias.	9-Entregables Formales	30/08/2014		30/08/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Gestión con la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para cooperación técnica.	9-Entregables Formales	20/09/2014		20/09/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Mesas de trabajo con INEC y MAGAP para revisión de boleta censal del Censo de UPA.	4-Inicio de Trabajo	25/09/2014		25/09/2014		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Eventos de sociabilización del Censo de UPA con el sector agropecuario de San Cristóbal y Santa Cruz.	9-Entregables Formales	02/10/2014		02/10/2014		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Capacitación a postulantes para empadronadores del Censo. Consecutivamente en cada uno de los cantones iniciando en San Cristóbal.	9-Entregables Formales	25/10/2014		25/10/2014		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Levantamiento de datos en campo.	5-Entregables Intermedios	12/12/2014		12/12/2014		Sí	7.0
13	EJECUCIÓN: Crítica y validación de consistencia de las boletas censales diligenciadas.	9-Entregables Formales	18/12/2014		18/12/2014		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Digitación de datos levantados.	9-Entregables Formales	20/12/2014		20/12/2014		Sí	4.0
15	EJECUCIÓN: Configuración de base de datos en formatos estandarizados del INEC.	9-Entregables Formales	15/02/2015		05/02/2015		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Construcción de un boletín con el resumen cuantitativo de los resultados del Censo.	9-Entregables Formales	15/02/2015		14/02/2015		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Realización de mesas de trabajo con técnicos de la Dirección de Producción y Desarrollo Humano (CGREG) para análisis de datos. Definición de secciones.	9-Entregables Formales	03/03/2015		03/03/2015		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN: Envío de propuesta de publicación a Comunicación.	9-Entregables Formales	30/03/2015		30/03/2015		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Realización de una segunda publicación de naturaleza únicamente electrónica con datos tabulados	9-Entregables Formales	30/03/2015		30/03/2015		Sí	1.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de las variables del Censo de UPA desagregado a tamaños de UPA.							
20	EJECUCIÓN: Edición y diseño gráfico de publicaciones para difusión. Bases de datos procesadas para difusión.	9-Entregables Formales	20/04/2015		20/04/2015		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN: Construcción del prototipo del sitio web para difusión de indicadores.	9-Entregables Formales	25/04/2015		25/04/2015		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Taller de trabajo con el director y técnicos del MAGAP para análisis de los indicadores seleccionados para publicar en compendio estadístico.	9-Entregables Formales	26/05/2015		26/05/2015		Sí	7.0
23	EJECUCIÓN: Construcción de mapas temáticos sobre uso de suelos de las UPA de Galápagos.	9-Entregables Formales	28/05/2015		28/05/2015		Sí	2.5
24	EJECUCIÓN: Plan de trabajo para el levantamiento de archivo de gestión de vehículos.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	5.0
25	EJECUCIÓN: Evento de lanzamiento de resultados del Censo de UPA.	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.5
26	EJECUCIÓN: Propuesta de proyecto para generación de información estadística que requiera el SIIG.	9-Entregables Formales	15/07/2015		15/07/2015		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Para el proyecto SIIG digitación de datos de los registros administrativos de gestión de vehículos del CGREG.	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Edición del documento final Análisis del Censo Agropecuario.	9-Entregables Formales	01/09/2015	01/09/2015			No	3.0
29	EJECUCIÓN: Realización de mesas de trabajo con técnicos de MAGAP e INEC para análisis de datos. Sección 4.	9-Entregables Formales	11/09/2015	11/09/2015			No	1.0
30	EJECUCIÓN: Realización de mesas de trabajo con técnicos de MAGAP e INEC para análisis de datos. Sección 5.	9-Entregables Formales	11/09/2015	11/09/2015			No	1.0
31	EJECUCIÓN: Diseño de imprenta y aprobación del documento final.	9-Entregables Formales	16/10/2015	16/10/2015			No	1.0
32	CIERRE: Evento de lanzamiento de publicación del Censo Agropecuario.	9-Entregables Formales	11/11/2015	11/11/2015			No	4.0
33	CIERRE: Informe sobre precios de Canastas Analíticas: Básica y Vital	9-Entregables Formales	24/11/2015	24/11/2015			No	4.0
34	CIERRE: Informe final sobre el proyecto Sistema Integrado	9-Entregables Formales	30/11/2015	30/11/2015			No	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Encuestas para el Régimen Especial							

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Publicaciones con información estadística		100.00 %	1	1	15/01/2014	Abr-Jun
2	Número de actualizaciones de la página web de indicadores SIIG		-	-	-	01/04/2015	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	81,087.18 **
Costo Total:	234,433.20
Total Devengado:	57,622.02
% Costo Total Devengado:	24.58 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 24.58 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	88,289.20	48,368.60	0.00	136,657.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	88,289.20	146,144.00	0.00	<b>234,433.20</b>
Ppto. Codificado	34,398.58	40,778.64	0.00	75,177.22
Ppto. Comprometido	32,718.58	24,903.44	0.00	57,622.02
Planeado - Codificado (2015)		7,589.96		
<b>Programado a Devengar</b>	35,053.40	48,368.60	0.00	<b>83,422.00</b>
Ppto. Devengado	32,718.58	24,903.44	0.00	57,622.02
Estimado a fin de año	* 32,718.58	48,368.60	0.00	81,087.18
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,334.82	0.00	0.00	2,334.82
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.34 %	51.49 %	0.00 %	69.07 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015**

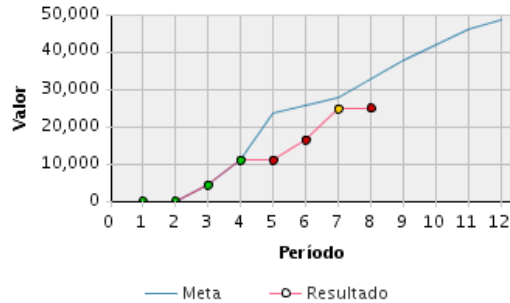

**Presupuesto Mensual 2015**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %



Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	4,253.20	4,253.20	4,253.20	4,253.20	100.00 %		8.79 %
Abr	6,696.44	6,696.44	10,949.64	10,949.64	100.00 %		22.64 %
May	12,500.96	0.00	23,450.60	10,949.64	46.69 %		22.64 %
Jun	2,025.00	5,490.80	25,475.60	16,440.44	64.53 %		33.99 %
Jul	2,302.00	8,288.00	27,777.60	24,728.44	89.02 %		51.12 %
Ago	4,997.00	175.00	32,774.60	24,903.44	75.98 %		51.49 %
Sep	4,897.00		37,671.60				
Oct	3,997.00		41,668.60				
Nov	4,500.00		46,168.60				
Dic	2,200.00		48,368.60				
<b>Total</b>	<b>48,368.60</b>	<b>24,903.44</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la planificación institucional MEDIANTE coordinación, levantamiento y documentación de los procesos de CGREG, elaboración de publicaciones, generación de información institucional y regional.
7	Incrementar la participación ciudadana en la planificación de la provincia MEDIANTE la implementación de procesos participativos con la ciudadanía.
8	Incrementar el cumplimiento y la ejecución de los objetivos institucionales, planes, programas, proyectos y actividades MEDIANTE el uso de GPR y seguimiento a la ejecución del POA y PAI.
9	Incrementar la planificación territorial MEDIANTE la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Galápagos, Elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquias Rurales, articulación de la cooperación internacional con los objetivos PDOTG, implementación del plan de ordenamiento del MINTUR, desarrollo de normas técnicas y estándares ambientales

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 20 Y 21: Publicación de resultados tabulados del Censod e UPAs de Galápagos	Resumen_por_Tamaño_UPA.pdf	04/05/2015
2	ASOCIACIÓN HITO 1.-DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	A.1.pdf.pdf	05/02/2014
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- Boletín de prensa sobre presentación del Censo Agropecuario a productores de Galápagos	131_El_Censo_Agropecuario_se_presentó_a_productores_de_Santa_Cruz.jpg	30/01/2015
4	ASOCIACIÓN HITO 11.- Informe de la capacitación al personal del Censo de UPAs en Isabela	Informe_capacitacion_Isabela.pdf.pdf	02/02/2015
5	ASOCIACIÓN HITO 11.- Informe de la capacitación al personal del Censo de UPAs en San Cristóbal	InformeCursoCUPAG2014-SanCristobal.pdf	02/02/2015
6	ASOCIACIÓN HITO 12 y 13.-Informe de finalización de trabajo de campo en Isabela	Informe_finalización_trabajo_campo_Isabela.pdf	30/01/2015
7	ASOCIACIÓN HITO 12 y 13.- Informe de finalización de trabajo de campo en San Cristóbal	Informe_finalización_trabajo_campo_san_cristobal.pdf	30/01/2015
8	ASOCIACIÓN HITO 12 y 13.- Informe de finalización de trabajo de campo en Santa Cruz	Informe_finalización_trabajo_campo_sta_cruz.pdf	30/01/2015
9	ASOCIACIÓN HITO 2.-Contrato de trabajo de técnico que ejecutará el proyecto	Conrato-FreddyVargas(1).pdf	30/01/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	ASOCIACIÓN HITO 25. Se adjunto el listado de asistentes	Registro_de_Asistencia.pdf	09/07/2015
11	ASOCIACIÓN HITO 3.- Convenio entre el CGREG y el INEC para cooperación interinstitucional y ejecución de proyectos	Convenio_INEC_2014.pdf	30/01/2015
12	ASOCIACIÓN HITO 4 y 5.-Manual metodológico del Censo de Agropecuario	ManualMetodológicoCensoUPAs_Galapagos.pdf	30/01/2015
13	ASOCIACIÓN HITO 6 y 9.- Boleta censal del Censo Agropecuario de Galápagos	Cuestionario_imprenta_version_final.pdf	30/01/2015
14	ASOCIACIÓN HITO 7.- Oficio socialización boleta censal institucion involucrada	Socializacion_boleta_censal.pdf	30/01/2015
15	ASOCIACIÓN HITO 8 .- Gestión de apoyo interinstitucional con el MAGAP	Solicitud_de_apoyo_institucional_MAGAP.pdf	30/01/2015
16	ASOCIACIÓN HITO 8.- Finalización de la fase de validación de contenido de las boletas censales realizada por el MAGAP	Agradecimiento_MAGAP.pdf	30/01/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Becerra Hernandez, Juan Carlos	Director de Planificación ( E)	Director de Planificación	juan.becerra@cgg.gob.ec
Granda León, Marianita de Lourdes	Lider de Proyecto	Coordinador de la Unidad de Estadística	mgranda@gobiernogalapagos.gob.ec
